







वित्तीय प्रगति



शिर्षक	विनियोजन (रु)	खर्च (रु)	खर्च (%)
कुल बजेट	९२२७८३०००	७६३७८७०००	८२.७६
चालू खर्च	४९५५४४०००	४४३५९८०००	८९.५२
पूँजीगत खर्च	४२७२३९०००	३२०१८९०००	७४.९४



वित्तीय प्रगति

आर्थिक विकास,



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
क	आर्थिक विकास	६५२०८७३८	४९८३४७८४	६४.९६	
१	कृषि	३००४८४३७	९६८४९३६२	५६.०७	
२	उद्योग	४२४००००	४२३७२५९	९९.९४	
३	पर्यटन	९९९६००८५	३४९४४४७	३९.३९	
४	सहकारी	७०००००	३९५०००	४५	
५	वित्तीय क्षेत्र	९०००००	९९५००	९९.५	
६	जलश्रोत तथा सिंचाई	३३३००००	२०८०९७९	६२.४७	
७	पशुपन्छी विकास	९५६३०२९६	९४७५९०४५	९४.४३	



वित्तिय प्रगति सामाजिक विकास



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ख	सामाजिक विकास	३९१५८४५२९.८०	३५३१९२१८६.८१	९०.२०	
१	शिक्षा	२६०१२११८२	२४६०१६४१९.३०	९४.५८	
२	स्वास्थ्य	७६५७३०००	६८६७७६४५	८९.६९	
३	खानेपानी तथा सरसफाई	५२६००००	४७७११६०	९०.७१	
४	भाषा तथा संस्कृति	३७९६६८२	३४८५०५५	९१.७९	
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१५३७६३०५	९५५३३१६	६२.१३	
६	युवा तथा खेलकुद	१२५७७४३७	७३८५४०९	५८.७२	
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१७८७९९२३.८०	१३३०३१८२.५१	७४.४०	



वित्तिय प्रगति पूर्वाधार विकास



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ग	पूर्वाधार विकास	२९७१४०९६१.८०	२१९४४८१८३.८६	७३.८४	
१	यातयात पूर्वाधार	२३३८१८३८५.४०	१७०२८०८५९.८६	७२.८३	
२	भवन आवास तथा सहरी विकास	५७१२६५७६.४०	४४६८८६०८	७८.२३	
३	उर्जा	२९९६०००	१७६५९०९	५८.९४	
४	सम्पदा पूर्वाधार	२१०००००	१६१४००७	७६.८६	
६	पुननिर्माण	११०००००	१०९८८००	९९.८९	



वित्तीय प्रगति

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र,



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
घ	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१८५३४४३८.२०	१३९०५९९५	७५.०३	



वित्तीय प्रगति


सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र,



सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	कैफियत
ड	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१५०३१५११२.२०	१३५४०६६८३.९२	९०.०८	



वित्तीय प्रगति जम्मा खर्च,

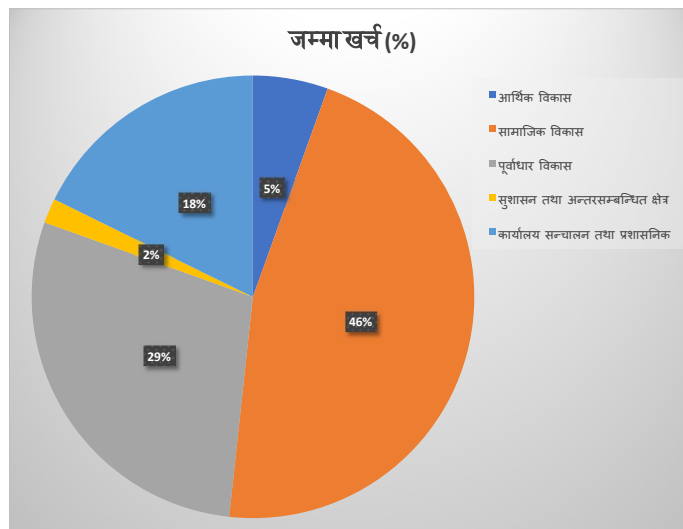

भौतिक प्रगति



शिर्षक	संख्या	कैफियत
जम्मा योजना संख्या	८६५	
उपभोक्ता समितीबाट सञ्चालित योजना संख्या	६५६	
ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएका योजना संख्या	२७	
कोटेसन विधीबाट संचालित योजना	३५	



भौतिक प्रगति



तराई मधेश सम्बृद्धि कार्यक्रम

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	७५०००००	७००९०००	९३.४५	३	३	-



भौतिक प्रगति



मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	७००००००	७००००००	१००	२६	२६	-



भौतिक प्रगति

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	६८२६०००	४९२६०००	७२.१६	२३	१९	-



भौतिक प्रगति

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम



सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	२७०००००	२७०००००	१००	११	११	-



भौतिक प्रगति



सुरक्षित आप्रवासन परियोजना

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	२००००००	१९९९०००	९९.९९	११	११	-



भौतिक प्रगति



बहुक्षेत्रिय पोषण

सि. नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	३२०००००	३१९००००	९९.९६	१७	१७	



भौतिक प्रगति वडा स्तरिय



वडा न	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	४०८४०००	३६४५०००	८९.२४	२६	२६	
२	६७३००००	४९६६०००	९१.०२	३४	३४	
३	३४३००००	२८०८०००	८१.८८	१२	१२	
४	९१५८०००	७८९५०००	८६.२	३९	३०	
५	५५५३०००	४४७६०००	८०.६१	१८	१८	



भौतिक प्रगति वडा स्तरिय



वडा न	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
६	३५३१०००	२९८४०००	८४.५२	२५	२५	
७	३६८५०००	३४९४०००	९४.८	१६	१६	
८	३४९००००	३३६३०००	९६.३७	१४	१४	
९	४४३४०००	३६५२०००	८२.३६	१९	१९	
१०	४७४८०००	४६५१०००	९७.९६	१७	१७	



भौतिक प्रगति वडा स्तरिय



वडा नं.	विनियोजन	खर्च (रु)	खर्च (%)	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
११	४३४८०००	३४३३०००	७८.९५	१५	१५	
१२	५२४४०००	४९५१०००	९४.४२	३०	३०	
१३	५५९४०००	५३९३०००	९६.४०	४०	४०	
१४	५८०३०००	५५८००००	९६.१५	३२	३२	
१५	५९३५०००	५०१००००	९७.५७	४०	४०	
१६	५९३००००	५९०१०००	९९.४३	२८	२८	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
१	ग्रामेल सडक निर्माण	कि.मि.	३७	३५.६६	
२	कालोपत्रे सडक निर्माण	कि.मि.	१७.७३३६	१३.२०६६	
३	पि.सी.सी.आर.सि.सि सडक निर्माण	मि.	१७००	१६६२.५	
४	कालोपत्रे सडक मर्मत	मि.	९७५	९९४.५	
५	सडक स्तरोन्ती	मि.	९८००	९८५७	
६	सडक नाला निर्माण	कि.मि.	३१.५	३१.४१	
७	सडक पुल निर्माण (कल्मर्ट) मर्मत	वटा	११	११	
८	सडक साईड वाल निर्माण	मि.	८००	७८६.२	
९	सामुदायिक भवन/ट्रस्ट निर्माण तथा मर्मत	वटा	३६	३६	
१०	मन्दिर/गुम्बा/चर्च निर्माण तथा मर्मत	वटा	२७	२७	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
११	विद्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नती	वटा	२२	२१	
१२	स्वास्थ्य चौकी-छोप केन्द्र-आइसोलेशन भवन	वटा	७	७	
१३	चर्पी निर्माण	वटा	७	७	
१४	डिप टयूबेल वोरिङ्ग निर्माण	वटा	१	१	
१५	वोरिङ्ग -स्यालो टयूबेल निर्माण	वटा	२६	२६	
१६	हाट बजार-पशु हाट बजार निर्माण तथा मर्मत	वटा	१	१	
१७	कम्पाउण्ड वाल निर्माण	मि.	६५०	६११२	
१८	नदी नियन्त्रण एबम् तटबन्धन (गेवीन जाली)	मि.	१०५	१०५	
१९	सिंचाई-खानेपानी पाइपलाइन	मि.	४३००	४३६२	
२०	पार्क निर्माण तथा मर्मत	वटा	३	३	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
२१	कुलो सरसफाई	मि.	५८९५	५८९५	
२२	सिमासार क्षेत्र प्रबर्द्धन	वटा	२	२	
२३	ह्यूम पाइप खरीद	वटा	१६२	१६२	
२४	कभर्डडल -व्याडमिन्टन कोर्ट-खेलमैदान निर्माण	वटा	५	५	
२५	पर्यटन क्षेत्र निर्माण	वटा	३	३	
२६	बडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत	वटा	७	७	
२७	खरको छानो बिस्थापन -सुरक्षित नागरिक आवास	वटा	२५६	२१५	
२८	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	वटा	२३	१९	
२९	घर नक्सा पास	वटा		४०	
३०	घर नक्सा अभिलेखिकरण	वटा		४९५	



घर नक्सापास विवरण



वडा न.	१	२	३	४	५	६	७
नक्सा पास /इजाजत	-	३	-	२१	३	१	१

वडा न.	८	९	१०	११	१२	१३	१४
नक्सा पास /इजाजत	-	१	३	-	२	-	२

वडा न.	१५	१६	
नक्सा पास/इजाजत	२	१	४०



घर अभिलेखीकरण विवरण



वडा न.	१	२	३	४	५	६	७
संख्या	२२	८९	३	१५८	१३	११	२८

वडा न.	८	९	१०	११	१२	१३	१४
संख्या	९	१२	१०	७	२४	७	५७

वडा न.	१५	१६	
संख्या	२३	२२	४९५



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई		प्रगती	कैफियत
३१	ऐन,नियम र कार्यविधि निर्माण	वटा		१४	
३२	DPR तयार	वटा	१	१	
३३	बालमैत्री नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन	वटा	२	२	
३४	विद्यालयका छात्राहरूलाई गैर आवासीय छात्रवृत्ति वितरण	जना	४०४२	४०४२	
३५	सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अनुदान	जना	९६४३	९६४३	
३६	दिवा खाजा कार्यक्रम	विद्यालय	३६	३६	
३७	ICT ल्याब स्थापना भएको विद्यालय	विद्यालय	४	४	
३८	चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण	विद्यालय	४	४	
३९	दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माण	विद्यालय		२	
४०	नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम	विद्यालय	१	१	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
४१	पुस्तकालय स्थापना	विद्यालय	१	१	
४२	विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको विद्यालय	विद्यालय	२	२	
४३	सामुदायिक विद्यालयबाट SEE गरी कक्षा ११ मा अध्ययनरत गरिब तथा जेष्ठान्दार छात्रवृत्ति	जना	३२	३२	
४४	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्न्तगत स्थानीय स्तरमा रोजगारी पाएका सङ्ख्या	जना	११४	११४	
४५	पशु उपचार सेवा	सङ्ख्या		९०५	
४६	पशु खोप सेवा	सङ्ख्या		३१५२५	
४७	पशु कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.)	सङ्ख्या		३५२७	
४८	घाँस विकास कार्यक्रम	हेक्टर		२४६	
४९	इलेक्ट्रिक च्याप कटर	धान		४०	
५०	काउ म्याट वितरण	धान		६०	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
५१	माछा भुग वितरण	के. जी.		४७५	
५२	व्यावसायिक पशुपंक्षी फर्म दर्ता नवीकरण	वटा		५३	
५३	दुध उत्पादन (वार्षिक)	मे. टन.		६८४३	
५४	फल उत्पादन (वार्षिक)	हजार		३२८५	
५५	मासु उत्पादन (वार्षिक)	मे. टन.		८६६	
५६	पम्पसेट (समरसियल मोटर वितरण)	थान		११	
५७	स्यालो टयुबेल वितरण	थान		२४	
५८	हाते स्पेयर वितरण	थान		१०	
५९	मकै छोडाउने मेसिन वितरण	थान		१०	
६०	मिनिटेलर वितरण	थान		६	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
६१	पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा	सङ्ख्या		१५	
६२	सुत्केरीहरूलाई सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण	सङ्ख्या		६८५	
६३	प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध हुने रू दुई लाखको सिफारिस	सङ्ख्या		११	
६४	विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस	सङ्ख्या		९१	
६५	शाय डेक्का सञ्चालन	सङ्ख्या		८	
६६	५ लाखसम्म पुँजी भएका व्यवसाय उद्योग तर्फका दर्ता	सङ्ख्या		८३	
६७	५ लाख सम्म पुँजी भएका व्यवसाय वार्षिक तर्फका	सङ्ख्या		७६	
६८	नगरपालिकामा सूचिकृत भएका व्यवसाय	सङ्ख्या		३६३	
६९	मेलामिलाप भएका मुद्दा	सङ्ख्या		४	
७०	छलफल भएका मुद्दा	सङ्ख्या		३०	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
७१	जन्मदता	सङ्ख्या		१८५९	
७२	मृत्यु दता	सङ्ख्या		६२२	
७३	विवाह दता	सङ्ख्या		८९४	
७४	बसाइ सराई (२३३३ आएको, ९९० गएको)	सङ्ख्या		३३२३	
७५	सम्बन्ध विच्छेद	सङ्ख्या		९७	
७६	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, जेष्ठ ३२४० अन्य, जेष्ठ दलित: ५३८, जेष्ठ नागरिक एकल महिला: ८७१ विधवा आर्थिक सहायता: ११७१, लोपोन्मुख: ४२, पूर्ण अपाङ्ग: १३०, आशिक अपाङ्ग: ३६३ दलित बालबालिका: ७९६	सङ्ख्या		७५१	
७७	परिचयपत्र वितरण पूर्ण अपाङ्ग: २६, आशिक: ३७ मध्यम: ३३ र सामान्य: १७ गरी जम्मा: ११३	सङ्ख्या		११३	
७८	परिचय पत्र वितरण (जेष्ठ नागरिक, पुरुष ८, महिला ११)	सङ्ख्या		१९	
७९	आन्तरिक आय रू (हाटवजार, दस्तुर, कर शुल्क बेरुज)	रू	५००००००	५७८४२७९.४	



भौतिक प्रगति



सि.नं.	शिर्षक	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	कैफियत
८१	छलफल भएका मुद्दा	संख्या		३१	
८२	जन्मदता	संख्या		१७००	
८३	मृत्यु दता	संख्या		५८४	
८४	विवाह दता	परिवार		५७४	
८५	बसाइ सराई (८८६ आएको, ४९४ गएको)	संख्या		१३८०	
८६	सम्बन्ध विच्छेद	परिवार		३९	
८७	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जेष्ठ ३४५२ अन्य: जेष्ठ दलित: ५०९, जेष्ठ नागरिक एकल महिला: ९४८ विधवा आर्थिक सहायता: ११८८, लोपोन्मुख: ४३, पूर्ण अपाङ्ग: ११६, आशिक अपाङ्ग: ३७६ दलित बालबालिका: ८६२	जना		७४९४	
८८	परिचय पत्र वितरण पूर्ण अपाङ्ग: २१, आशिक: २६ मध्यम: २४ र सामान्य: ३ गरी जम्मा: ७४	जना		७४	
८९	परिचय पत्र वितरण (जेष्ठ नागरिक, पुरुष १५, महिला ८)	जना		२३	



प्राथमिकतामा रहेका नगर स्तरीय मुख्य योजनाहरू :



- ❖ सबै वडाका आफ्नै भवन ।
- ❖ सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था भवन ।
- ❖ उद्योग ग्राम स्थापना ।
- ❖ कञ्चनगढी क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, बुद्धमंगल ताल, बनदेवी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
- ❖ सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य
- ❖ नाला निर्माण तथा खोला सफाई कार्य



समस्या तथा चुनौतीहरू :



- ❖ विद्यालय, उद्यान, खेल पूर्वाधार, खोला सफाई र सामूदायीक प्रकृतिका भवन निर्माण जस्ता आयोजना सन्चालनमा जनसहभागिता आपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्नु ।
- ❖ योजनाको संख्या धेरै तर योजनाको नियमित सुपरिवेक्षण गर्न प्रयाप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी ।
- ❖ आन्तरिक श्रोतको न्यून परिचालन ।
- ❖ नदिजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन



समस्या सामाधानका लागि नगरपालिकाबाट भएका प्रयासहरु :



- ❖ प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई दैनिक ज्यालादारी र सेवा करारको माध्यमबाट काममा लगाइएको त्यसबाट योजना कार्यान्वयनमा केही सहजता आएको ।
- ❖ निर्माण व्यावसायीहरुले ठेक्का हात पार्न को लागि गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालित सबै योजनाहरु विद्युतीय बोलपत्र (E Bidding) मार्फत गर्ने गरिएको
- ❖ आन्तरिक श्रोतको परिचालन गर्ने उद्देश्यले सबै हाट बजार, पाडा बजार वर्दघाट बसपार्कलाई करको दायरामा ल्याइएको र वहाल कर र व्यवसाय कर संकलनमा स्थानीय टोल विकास संस्था परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
- ❖ योजनाको संख्या कम गर्न २ लाख भन्दा कम लागतका पूर्वाधारका योजना छनौट नगर्ने नीति अनुरूप योजना तर्जुमा गरिएको ।
- ❖ चालु आ.व.मा नदिजन्य पदार्थ ठेक्का नलगाई व्यवस्थित उपयोग गर्ने तयारी गरिएको




योजनाका केही फोटोहरु



बर्गदहि मस्जिद पछाडीको गोरेटो बाटो
PCC ढलाई, वडा न १२



योजनाका केही फोटोहरु

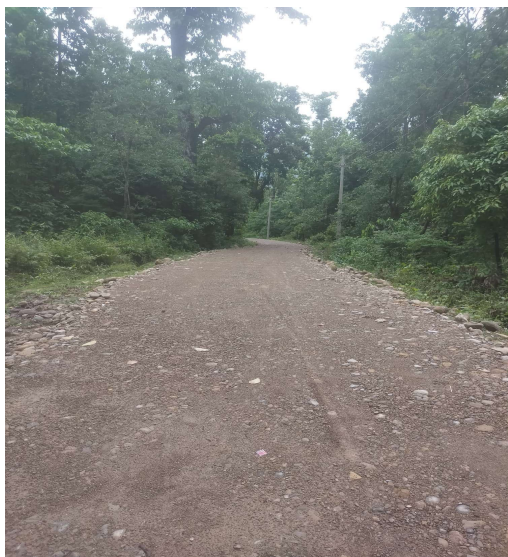

भुताहा देखि बासखोला बाटो मर्मत, वडा न २



योजनाका केही फोटोहरु



पोखरी टोल सिमा सडक स्तरोन्नति, वडा न १३



योजनाका केही फोटोहरु



पक्की कुलो निर्माण जयनगर वडा न १३



योजनाका केही फोटोहरु



सामुदायिक भवन निर्माण, वडा न १३





योजनाका केही फोटोहरु



खुल्ला व्यायम केन्द्र (Open Gym) वडा नं ४



योजनाका केही फोटोहरु



४ न वडा कार्यलय भवन



योजनाका केही फोटोहरु



१३ न वडा कार्यलय जाने बाटो देखि कालिका मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति



योजनाका केही फोटोहरु



औद्योगिक ग्राम छेत्रमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण, वडा न ५



योजनाका केही फोटोहरु



सुखौरा परि जाने बाटो स्तरोन्नति (RCC) -२



योजनाका केही फोटोहरु



गण्डक नहर उत्तर आमोस तामाङको घर हुदै बुद्ध चोकसम्म सडक कालोपत्रे, वडा नं १५



सभा हल निर्माण वडा नं ९



योजनाका केही फोटोहरु



मझौनी खोप केन्द्रको अधुरो भवन
निर्माण, वडा नं १३



योजनाका केही फोटोहरु



कन्चनगढी पर्यटन क्षेत्र निर्माण , वडा नं ५



योजनाका केही फोटोहरु



लामिछाने चोक देखि खातुन निशाको घर सम्म बाटो ग्राभेल, वडा नं ५



योजनाका केही फोटोहरु



कृषि सेवा केन्द्र मर्मत, वडा न १३



योजनाका केही फोटोहरु



राजा महात्मा पुर्णभद्र मा. वि
वडा न ९



योजनाका केही फोटोहरु



उद्योग वाणिज्य संघ मर्मत कार्य ,
वडा नं ४



योजनाका केही फोटोहरु



स्वास्थ्य चौकी भवन वडा नं ७



धन्यवाद
